


Stand der Bauarbeiten zur Kanalisation und Wasserversorgung Bundkofen GEP 20+21

Die Bauarbeiten der 6. Etappe sind in Ausführung und schreiten planmässig voran. Diese Etappe wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 38 abgeschlossen und mit den Grabenaushubarbeiten für die Etappe 7 kann begonnen werden. Die Grabenaushubarbeiten der Wasserleitung sind in der Etappe 7 weitgehend abgeschlossen und die Provisorien konnten in der Kalenderwoche 37 erstellt werden.

Die Verlegearbeiten der Wasserleitung werden bis zum Projektende fortgesetzt.

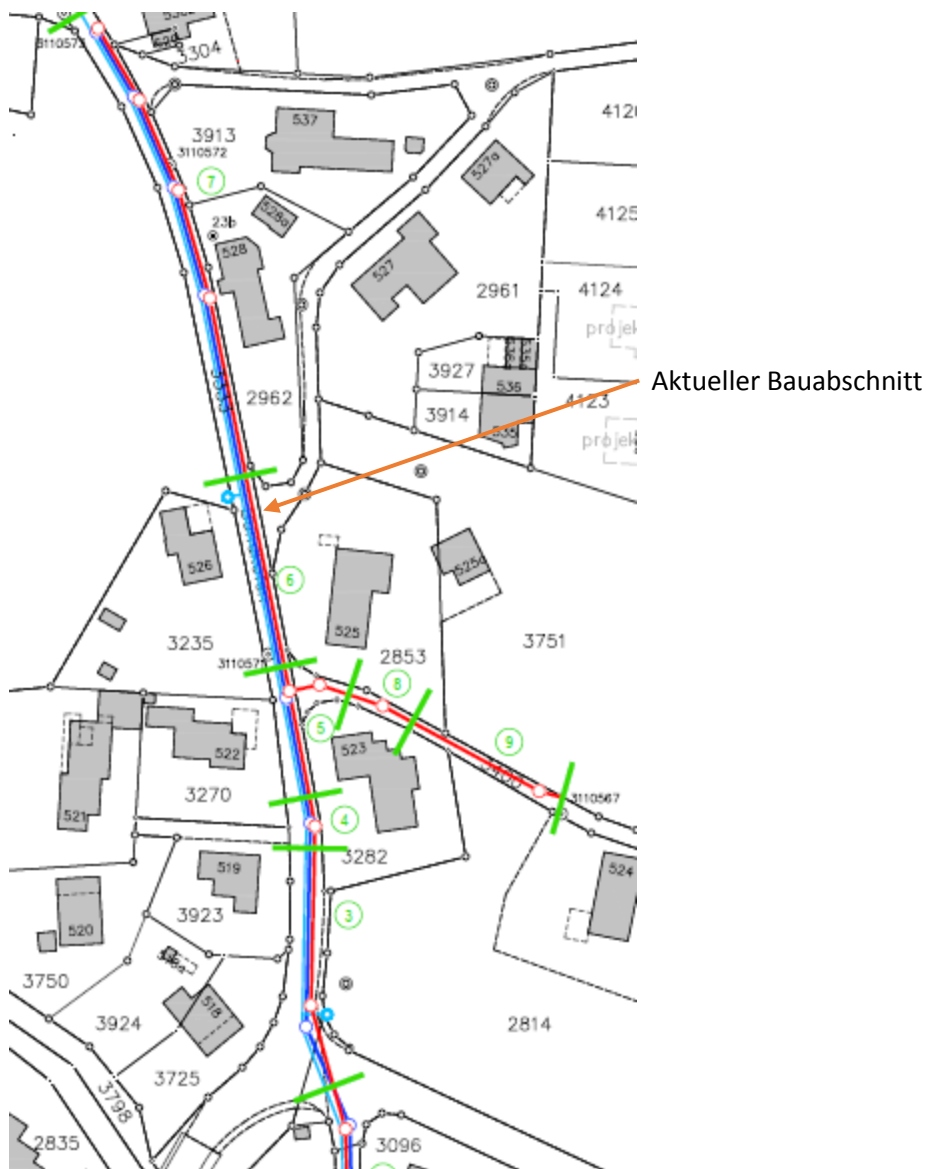

Den Hauskehricht sowie das Grüngut können weiterhin am vorgesehenen Sammelplatz deponiert werden. Die Verantwortlichen der Firma Fankhauser werden, wenn eine Zufahrt durch die Kehrlichtabfuhr nicht möglich ist, die Container und Säcke am Abfuhrtag am Baustellenende für die Firma Schwendimann AG zur Abholung bereitstellen.

Die Firma Fankhauser wurde ausserdem angewiesen, anhand des jeweiligen Baufortschritts die betroffenen Anstösser min. 24 h im Voraus direktüber Einschränkungen oder Änderungen der Zugänglichkeit zum Grundstück zu informieren.

Über temporäre Unterbrüche in der Trinkwasserversorgung oder die Erstellung von provisorischen Hauswasseranschlüssen werden Sie von der Bauverwaltung Schüpfen in Zusammenarbeit mit der Firma Schneider & Schmid GmbH jeweils vorgängig informiert.

Über den Stand der Arbeiten und allfällige Besonderheiten während dem Bau werden wir Sie weiterhin auf unserer Homepage www.schuepfen.ch auf dem Laufenden halten.

Bauverwaltung Schüpfen
