


Stand der Arbeiten Ersatz Trinkwasserleitungen Oberdorfstrasse

Trotz wiederholtem Auftauchen von unbekanntem Leitungen im Grabenbereich schreiten die Bauarbeiten planmässig voran und dritte Etappe konnte bereits planmässig realisiert werden.

Im Verlauf der Kalenderwochen 29 und 30 wird die vierte Etappe realisiert. Bis Ende Juli 2018 sollen die Grab- und Verlegearbeiten der Hauptleitungen im Strassenbereich abgeschlossen sein. Anschliessend folgen die Querungen.

Die neue Leitungsführung wird vorläufig in der linken Strassenhälfte weitergeführt. Je nach Platzverhältnissen im Grabenbereich kann sogar auf eine Querung im oberen Bereich der Oberdorfstrasse verzichtet werden.

Die Firma Weibel Muri AG hat in den Kalenderwochen 31 und 32 Bauferien. Dies wird zu einem kurzen Unterbruch der Bauarbeiten führen. Die Strassensperrung bleibt für den Durchgangsverkehr während dieser Zeit unverändert. Für die Anwohner bleibt die Zufahrt zu ihren Liegenschaften gewährleistet.

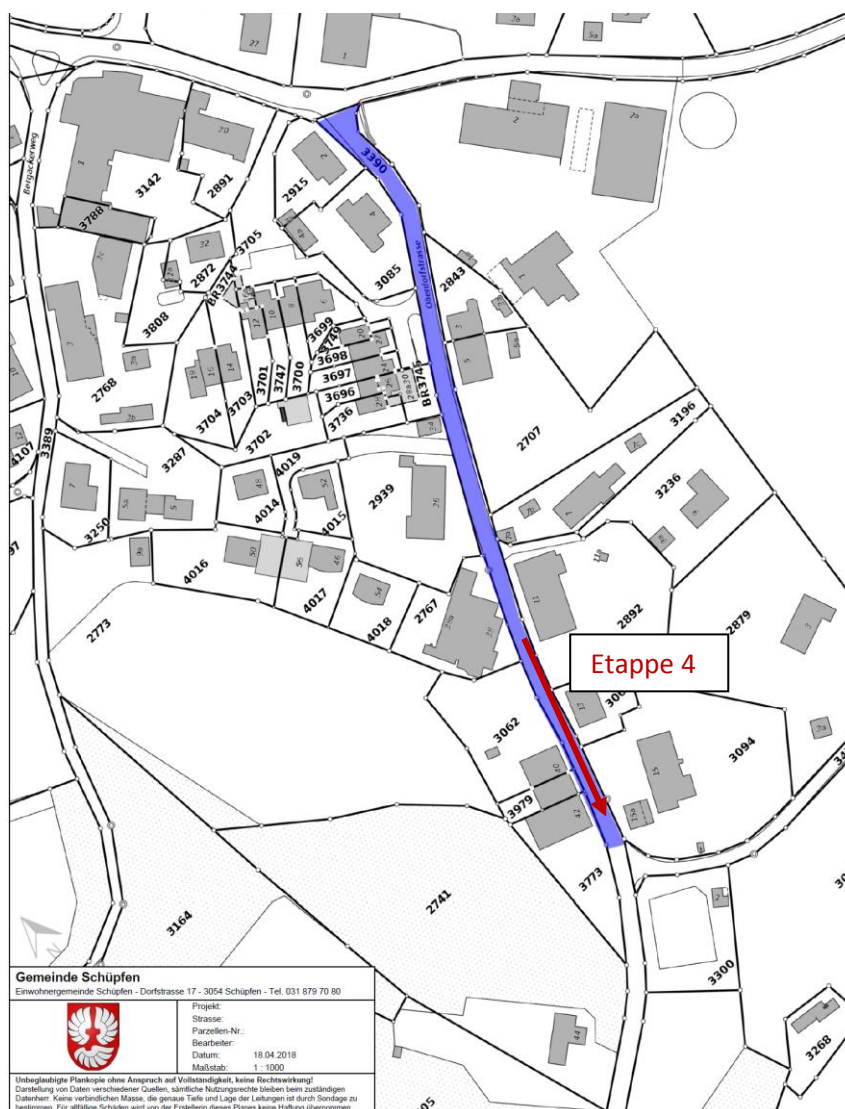

Obwohl die Verantwortlichen vor Ort bestrebt sein werden, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrsteilnehmenden auf ein Minimum zu beschränken, werden während den Bauphasen Verkehrsbehinderungen und Lärmimmissionen unvermeidbar sein.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für Ihr Verständnis und sind für die Beantwortung allfälliger Fragen gerne bereit.

Bauverwaltung Schüpfen
